# ZMLUVA O DIELO Č. 071001/9901/004

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## ČLÁNOK 1
## ZMLUVNÉ STRANY

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | **Objednávateľ:** | Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín<br>Ul. gen. Viesta 7<br>911 50 Trenčín |
| | Zastúpený: | Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ |
| | IČO: | 34 000 666 |
| | DIČ: | 2021352388 |
| | Bankové spojenie: | Štátna pokladnica<br>č. ú. 7000166109/8180 |
| | **Zhotoviteľ:** | TECHNOHALL Slovakia, spol. s r.o.<br>Ludrová 1<br>PSČ 034 71 |
| | Zastúpený: | Ján Andreides, konateľ |
| | IČO: | 36 421 286 |
| | DIC: | 2021862700 |
| | Bankové spojenie: | ČSOB a.s. Ružomberok<br>č.ú.: 4001580965/7500 |

## ČLÁNOK 2
## PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu: **„Martin – oprava strechy M Jankolu 10, 12, 14,16 “.**

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy .

2.3 Dielo bude zhotovené podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Po vykonaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný uviesť bleskozvod do pôvodného stavu.

2.4 Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia.

## ČLÁNOK 3
## CENA DIELA

2.5 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.v znení neskorších predpisov.

2.6 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a predstavuje:

Cena bez DPH:..... 301 281,45 Sk
DPH 19 %:.....57 243,39 Sk
**Cena diela celkom: .....358 524,84Sk**
Slovom: tristopäťdesiatosemtisíc päťstodvadsaťštyri Sk 84 hal

2.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa.

2.8 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k tejto zmluve:
- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán

2.9 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy(čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.

2.10 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za práce na základe obojstranne podpísaného Preberacieho protokolu

## ČLÁNOK 3
## PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená po zrealizovaní a úspešnom prevzatí diela objednávateľom, a to na základe faktúry zhotoviteľa,

3.2 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať tieto náležitosti:
a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
b) číslo faktúry
c) číslo zmluvy
d) označenie diela
e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
f) dátum splatnosti
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ak zhotoviteľ vo faktúre uvedie nesprávny údaj alebo faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v tejto ZoD, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej úhrady a bez následku omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť doručením novej faktúry

3.3 Prílohou faktúry bude obojstranne podpísaný preberací protokol

3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.

3.5 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.6 Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.

## ČLÁNOK 4
## MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

4.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela: Martin – ul. M. Jankolu 10, 12, 14,16 .

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do 15.12.2007.

4.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, ako aj klimatickými podmienkami. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

## ČLÁNOK 5
## POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie a s podmienkami zmluvy.

5.2 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Anton Filin, Ing. Vladimír Heglas, Ing. Oľga Martinisková a p. Miroslav Šiška

5.3 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné..

5.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

5.5 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

## ČLÁNOK 6
## POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

6.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp.subdodávateľa.

6.3 Zhotoviteľ je povinný doložiť platné certifikáty použitých hydroizolačných materiálov

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

6.5 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp.subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.

6.6 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať..

6.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom

jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy..

6.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

6.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

6.10 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ján Andreides

6.11 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác na streche objektu vykonať odbornú prehliadku bleskozvodov v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.za úhradu.(stav pred a stav po stavebných prácach)

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela..

6.13 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške nákladov na jeho vypratanie.

## ČLÁNOK 7
## POUŽITÉ MATERIÁLY

7.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.

7.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

7.4 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..

7.5 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.

7.6 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

## ČLÁNOK 8
## ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1.tejto zmluvy

8.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.

8.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: p. Miroslav Šiška a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené v súlade s bodom 7.20 tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2).

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

## ČLÁNOK 9
## DOKUMENTÁCIA

9.1 Dokumentáciu tvorí:

a) zápisnica o odovzdaní staveniska,
b) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, (preberací protokol)
c) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
d) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom

9.2 Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán.

9.3 Objednávateľ má právo priebežne kontrolovať priebeh prác a vydávať zhotoviteľovi pokyny na odstránenie nedostatkov v postupe prác pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.

## ČLÁNOK 10
## ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami Dňom odovzdania a prevzatia diela je deň uvedený v preberacom protokole, inak deň jej spísania.

## ČLÁNOK 11
## ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke **10** rokov.

11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady a nedorobky diela zistené pri preberacom konaní ako aj tie, ktoré sa prejavia počas záručnej doby. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. alebo na jeho adresu uvedenú v tejto zmluve Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi, pričom v prípade pochybnosti sa má za to, že reklamácia bola doručená na 3 deň po jej odoslaní. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej doby.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.

12.6 Ak sa ukáže , že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.

12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.

12.8 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.6 a 12.7 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

12.9 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

## ČLÁNOK 12
## ZMLUVNÉ POKUTY

12.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania

12.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 7.3., 7.4.,7.7.,7.9.,711.,12.6 a 12.7, tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania

12.3 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.

12.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.

12.5 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

12.6 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

## ČLÁNOK 13
## VYŠŠIA MOC

13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

13.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

13.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

## ČLÁNOK 14
## PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

14.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú:

a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
b) práce, ktoré neboli predmetom realizácie.

14.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

## ČLÁNOK 15
## PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

15.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.

15.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany písomne dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy.

15.3 Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

## ČLÁNOK 16
## VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

16.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

16.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.

16.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

16.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a na požiadanie objednávateľa predloží mu ho k nahliadnutiu . Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

16.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

16.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.

16.7 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.

17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovávania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.

16.8 Prílohy č.1- tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

## ČLÁNOK 17
## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi. Pre právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené platia príslušné ustanovenia zák.č.513/1993 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

17.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

17.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

V Trenčíne, dňa 19.10.2007

.....
Objednávateľ

v Ludrovej, dňa 18.10.2007

TECHNOHALL SLOVAKIA s.r.o.
Ludrová 1
034 71

.....
Zhotoviteľ

PRÍLOHA č. 1

# ZADANIE

**Stavba:** Oprava strechy ul. Jankolu or. č. 10, 12, 14, 16, Martin
**Zadávateľ:** BARMO ul. gen. Viesta, 911 50 Trenčín
**Časť:**
Dátum:
JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **HSV** | | **Práce a dodávky HSV** | | | | |
| | **9** | | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | |
| 1 | 013 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | t | | | 4800,00 |
| | **PSV** | | **Práce a dodávky PSV** | | | | |
| | **712** | | **Izolácie striech** | | | | |
| 2 | 711 | | Oprava povlakovej krytiny na strechách plochých na 10% plochy | m2 | 86,000 | 95,34 | 8200,00 |
| 3 | 711 | | Očistenie povlakovej krytiny na 10% plochy | m2 | 86,000 | 12,20 | 1050,00 |
| 4 | 711 | | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých náterom penetračným | m2 | 857,000 | 10,00 | 8570,00 |
| *5* | *111* | | *Lak asfaltový penetračný* | *m2* | *857,000* | *13,24* | *11354,50* |
| 6 | 711 | | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých pásmi pritav. NAIP na celej ploche | m2 | 857,000 | 105,00 | 89985,00 |
| *7* | *628* | | *Pásy ťažké asfaltové modifikované, s bridlicovým posypom* | *m2* | *985,550* | *133,31* | *131383,86* |
| 8 | 711 | | Údržba strešných vpustov | ks | 5,000 | 50,40 | 252,00 |
| 9 | 711 | | Údržba prienikov vetracích komínkov | m2 | 857,000 | 2,06 | 1767,00 |
| 10 | 711 | | Údržba bleskozvodových nosičov | m2 | 857,000 | 1,82 | 1559,74 |
| 11 | 711 | | Presun hmôt | % | | | 3213,75 |
| | **713** | | **Izolácie tepelné** | | | | |
| 12 | 713 | | Osadenie odvetrávacích komínikov | m2 | 857,000 | 2,06 | 1767,00 |
| *13* | *628* | | *Odvetrávacie komínčeky* | *m2* | *857,000* | *4,80* | *4113,60* |
| *14* | *552* | | *Strešný vpust* | *ks* | *5,000* | *400,00* | *2000,00* |
| | **767** | | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | |
| 15 | 767 | | Strešné výlezy - oprava rebríkov, závesov, izolácia poklopov | ks | 4,000 | 6241,25 | 24965,00 |
| | **OST** | | **Ostatné** | | | | |
| 16 | HZS | HZS-004 | Nešpecifikované práce | hod | | | 0,00 |
| 17 | 711 | | Dopravné | % | | | 6300,00 |

**Celkom** 301281,45
DPH 19%: 57243,39
Cena s DPH: 358 524,84 Sk

TECHNOHALL SLOVAKIA s.r.o.
Ludrová 1
034 71

# ZMLUVA O DIELO Č. 071001/9901/004

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák.č.513/1991
Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## ČLÁNOK 1
## ZMLUVNÉ STRANY

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | **Objednávateľ**: | Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín<br>Ul. gen. Viesta 7<br>911 50 Trenčín |
| | Zastúpený: | Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ |
| | IČO: | 34 000 666 |
| | DIČ: | 2021352388 |
| | Bankové spojenie: | Štátna pokladnica<br>č. ú. 7000166109/8180 |
| | **Zhotoviteľ**: | TECHNOHALL Slovakia, spol. s r.o.<br>Ludrová 1<br>PSČ 034 71 |
| | Zastúpený: | Ján Andreides, konateľ |
| | IČO: | 36 421 286 |
| | DIC: | 2021862700 |
| | Bankové spojenie: | ČSOB a.s. Ružomberok<br>č.ú.: 4001580965/7500 |

## ČLÁNOK 2
## PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu: **„Martin – oprava strechy M Jankolu 10, 12, 14,16 "**.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy .

2.3 Dielo bude zhotovené podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Po vykonaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný uviesť bleskozvod do pôvodného stavu.

2.4 Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia.

## ČLÁNOK 3
## CENA DIELA

2.5 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.v znení neskorších predpisov.

2.6 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a predstavuje:

Cena bez DPH:..... 301 281,45 Sk
DPH 19 %:.....57 243,39 Sk
**Cena diela celkom: .....358 524,84Sk**
Slovom: tristopäťdesiatosemtisíc päťstodvadsaťštyri Sk 84 hal

2.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa.

2.8 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k tejto zmluve:
- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán

2.9 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy(čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.

2.10 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za práce na základe obojstranne podpísaného Preberacieho protokolu

## ČLÁNOK 3
## PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená po zrealizovaní a úspešnom prevzatí diela objednávateľom, a to na základe faktúry zhotoviteľa,

3.2 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať tieto náležitosti:
a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
b) číslo faktúry
c) číslo zmluvy
d) označenie diela
e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
f) dátum splatnosti
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ak zhotoviteľ vo faktúre uvedie nesprávny údaj alebo faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v tejto ZoD, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej úhrady a bez následku omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť doručením novej faktúry

3.3 Prílohou faktúry bude obojstranne podpísaný preberací protokol

3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.

3.5 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.6 Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.

## ČLÁNOK 4
## MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

4.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela: Martin – ul. M. Jankolu 10, 12, 14,16 .

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do 15.12.2007.

4.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, ako aj klimatickými podmienkami. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

## ČLÁNOK 5
## POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie a s podmienkami zmluvy.

5.2 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Anton Filin, Ing. Vladimír Heglas, Ing. Oľga Martinisková a p. Miroslav Šiška

5.3 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné..

5.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

5.5 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

## ČLÁNOK 6
## POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

6.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp.subdodávateľa.

6.3 Zhotoviteľ je povinný doložiť platné certifikáty použitých hydroizolačných materiálov

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

6.5 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp.subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.

6.6 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať..

6.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom

jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy..

6.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

6.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

6.10 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ján Andreides

6.11 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác na streche objektu vykonať odbornú prehliadku bleskozvodov v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.za úhradu.(stav pred a stav po stavebných prácach)

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela..

6.13 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške nákladov na jeho vypratanie.

## ČLÁNOK 7
## POUŽITÉ MATERIÁLY

7.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.

7.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

7.4 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..

7.5 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.

7.6 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

## ČLÁNOK 8
## ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1.tejto zmluvy

8.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.

8.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: p. Miroslav Šiška a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené v súlade s bodom 7.20 tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2).

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

## ČLÁNOK 9
## DOKUMENTÁCIA

9.1 Dokumentáciu tvorí:

a) zápisnica o odovzdaní staveniska,
b) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, (preberací protokol)
c) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
d) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom

9.2 Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán.

9.3 Objednávateľ má právo priebežne kontrolovať priebeh prác a vydávať zhotoviteľovi pokyny na odstránenie nedostatkov v postupe prác pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.

## ČLÁNOK 10
## ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami Dňom odovzdania a prevzatia diela je deň uvedený v preberacom protokole, inak deň jej spísania.

## ČLÁNOK 11
## ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke **10** rokov.

11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady a nedorobky diela zistené pri preberacom konaní ako aj tie, ktoré sa prejavia počas záručnej doby. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. alebo na jeho adresu uvedenú v tejto zmluve Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi, pričom v prípade pochybnosti sa má za to, že reklamácia bola doručená na 3 deň po jej odoslaní. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej doby.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.

12.6 Ak sa ukáže , že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.

12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.

12.8 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.6 a 12.7 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

12.9 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

## ČLÁNOK 12
## ZMLUVNÉ POKUTY

12.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania

12.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 7.3., 7.4.,7.7.,7.9.,711.,12.6 a 12.7, tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania

12.3 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.

12.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.

12.5 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

12.6 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

## ČLÁNOK 13
## VYŠŠIA MOC

13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

13.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

13.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

## ČLÁNOK 14
## PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

14.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú:

a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
b) práce, ktoré neboli predmetom realizácie.

14.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

## ČLÁNOK 15
## PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

15.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.

15.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany písomne dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy.

15.3 Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

## ČLÁNOK 16
## VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

16.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

16.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.

16.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

16.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a na požiadanie objednávateľa predloží mu ho k nahliadnutiu . Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

16.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

16.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.

16.7 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.

17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovávania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.

16.8 Prílohy č.1- tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

## ČLÁNOK 17
## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi. Pre právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené platia príslušné ustanovenia zák.č.513/1993 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

17.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

17.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

V Trenčíne, dňa 17.10.2007

DOTOVÁ AGENTÚRA PRE SEKTOR
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 [illegible]
911 50 TRENČÍN

.....
Objednávateľ

v Ludrovej, dňa 18.10.2007

TECHNOHALL SLOVAKIA s.r.o.
Ludrová 1
034 71

.....
Zhotoviteľ

PRÍLOHA Č. 1

# ZADANIE

**Stavba:** **Oprava strechy ul. Jankolu or. č. 10, 12, 14, 16, Martin**
**Zadávateľ:** **BARMO ul. gen. Viesta, 911 50 Trenčín** Dátum:
**Časť:** JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | |
| | | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | |
| 1 | 013 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | t | | | 4800,00 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | |
| | | **712** | **Izolácie striech** | | | | |
| 2 | 711 | | Oprava povlakovej krytiny na strechách plochých na 10% plochy | m2 | 86,000 | 95,34 | 8200,00 |
| 3 | 711 | | Očistenie povlakovej krytiny na 10% plochy | m2 | 86,000 | 12,20 | 1050,00 |
| 4 | 711 | | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých náterom penetračným | m2 | 857,000 | 10,00 | 8570,00 |
| *5* | *111* | | *Lak asfaltový penetračný* | *m2* | *857,000* | *13,24* | *11354,50* |
| 6 | 711 | | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých pásmi pritav. NAIP na celej ploche | m2 | 857,000 | 105,00 | 89985,00 |
| *7* | *628* | | *Pásy ťažké asfaltové modifikované, s bridlicovým posypom* | *m2* | *985,550* | *133,31* | *131383,86* |
| 8 | 711 | | Údržba strešných vpustov | ks | 5,000 | 50,40 | 252,00 |
| 9 | 711 | | Údržba prienikov vetracích komínkov | m2 | 857,000 | 2,06 | 1767,00 |
| 10 | 711 | | Údržba bleskozvodových nosičov | m2 | 857,000 | 1,82 | 1559,74 |
| 11 | 711 | | Presun hmôt | % | | | 3213,75 |
| | | **713** | **Izolácie tepelné** | | | | |
| 12 | 713 | | Osadenie odvetrávacích komínikov | m2 | 857,000 | 2,06 | 1767,00 |
| *13* | *628* | | *Odvetrávacie komínčeky* | *m2* | *857,000* | *4,80* | *4113,60* |
| *14* | *552* | | *Strešný vpust* | *ks* | *5,000* | *400,00* | *2000,00* |
| | | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | |
| 15 | 767 | | Strešné výlezy - oprava rebríkov, závesov, izolácia poklopov | ks | 4,000 | 6241,25 | 24965,00 |
| | | **OST** | **Ostatné** | | | | |
| 16 | HZS | HZS-004 | Nešpecifikované práce | hod | | | 0,00 |
| 17 | 711 | | Dopravné | % | | | 6300,00 |

**Celkom** 301281,45
DPH 19%: 57243,39
Cena s DPH: 358 524,84 Sk

B A R M O
OBLASTNÁ SPRÁVA
DOMOVÉHO A BYTOVÉHO FONDU 33
Hviezdoslavova č. 2
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

---

L. Mikuláš 20. 9. 2007

**B A R M O**
**Ing. Štefan Fleischer**
**Ul. Gen. Viesta 7**
**T R E N Č Í N**

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/telefón |
|---|---|---|
| | OSDaBF-9-31/2007 | Ing. Martinisková<br>044/5570957 |

**Vec:**
**Žiadosť o realizáciu prác.**

Vážený pán riaditeľ!

Žiadam Vás týmto o povolenie na realizáciu nasledovných prác:

1. Oprava strechy na ul. Jankolu 10, 12, 14, 16, Martin, oprava bola zahrnutá v pláne opráv na tento rok ako urgentná akcia vzhľadom k tomu, že cez ňu preteká a zamoká do bytov.
Cenové ponuky:
a. Robstav, stavebné družstvo, Družstevná č. 6, 031 14 Liptovský Mikuláš, IČO 168319, IČ DPH SK 2020428784 v cene 499.840,20 Sk s DPH.
b. Šiška Miroslav, ul. Rázusova 3, 036 01 Martin, IČO 3473861, v cene 551.755,- Sk s DPH.
c. Technohall Slovakia spol. s r.o., 034 71 Ludrová 1, IČO 3642186, DIČ SK 2021862700 v cene 358.524,84 Sk s DPH.

Túto opravu odporúčam realizovať firmou Technohall Slovakia spol. s r.o. s najnižšou cenovou ponukou a najlepšími referenciami.

S pozdravom

Ing. Oľga Martinisková
vedúca OSDaBF 33 L.Mikuláš

Prílohy : Podľa textu

NIDATOP PVS 4

2.

# *ROZPOČET*
# *NA CELOPLOŠNÚ OPRAVU STREŠNEJ KRYTINY*

**Plocha izolovaná celkom 835m² + 22 m² ( vylepenie šácht 22 ks ) = 857 m²**

| Číslo Položky | **Názov položky** | Merná Jednotka | Cena za jednotku v SK | Spotreba | Cena spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 m²/Sk | 857m²/Sk |
| A | Hydroizolácia – vysprávky | | | | | 10 900 |
| A1 | Vrchný hydr.pás | $m^2$ | 125 | 1,2 | 150 | 128 550 |
| A2 | Podkladný hydr. Pás, | $m^2$ | | | | |
| A3 | Odvetrávacie komínky | ks | 240 | 0,02 | 4,8 | 4113,60 |
| A4 | Umelohmotné vpuste | ks | 400 | 5 ks | | 2000 |
| A5 | Pozinkovaný plech – lišty | bm | | | | |
| A6 | Tepelná izolácia | $m^2$ | | | | |
| A7 | Mechanické kotvy | ks | | | | |
| A8 | | | | | | |
| A9 | Plyn | ks | 420 | 0,04 | 16,8 | 14 397,60 |
| A10 | Spotrebný materiál | | | | 4,50 | 3856,50 |
| | | | | | | |
| | **Medzisúčet 1** | | | | | **163 817,70** |
| B | Vysprávky - práca | | | | | 8200 |
| B1 | Prevedenie izolácie – práce | Sk /$m^2$ | 105 | 1,00 | 105 | 89 985 |
| B2 | montáž plechov – práca | | | 1,00 | | |
| B3 | Vodorovný presun | | | | | |
| B4 | Zvislý presun | | 3,75 | 1,00 | 3,75 | 3213,75 |
| | | | | | | |
| | **Medzisúčet 2** | | | | | **265 216,45** |
| C | Montáž žľabov a zvodov | | | | | |
| C1 | Réžia výrobná 3% | | | | | |
| C2 | Réžia správna 3% | | | | | |
| C3 | Odvoz odpadu | | | | | 4800 |
| C4 | Doprava | | | | | 6300 |
| C5 | Oprava strešných výlezov | | | | | 24 965 |
| | **Medzisúčet 3** | | | | | **301 281,45** |
| D | | | | | | |
| D1 | Zľava | | | | | |
| D2 | SPOLU | | | | | 301 281,45 |
| D3 | DPH19% | | | | | 57 243,39 |
| | **SPOLU s DPH** | | | | | **358 524,84** |

418,40 / 41

**CENA:**

Cena na 1 m2 bez DPH..... 351,55 Sk

Cena spolu bez DPH..... 301 281,45 Sk
DPH 19%..... 57 243,39 Sk
**Cena spolu s DPH..... 358 524,84 Sk**

**PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY:**

Cena vyplatená na základe vystavenej faktúry, splatnosť 14 dní od jej vystavenia.
Doba realizácie: 6 – 12 dní v závislosti od počasia.
Všetky použité materiály sú certifikované.

**ZÁRUKA:**

Na prevedené práce a materiál poskytujeme záruku v trvaní **120 mesiacov** odo dňa ukončenia a prevzatia prác.

**PLATNOSŤ PONUKY :**

do 30.09.2007.

Firma Technohall Slovakia s.r.o. počas svojho trvania nezaznamenala žiadnu reklamáciu na prevedené práce a na použitý materiál. Veríme, že aj vy sa stanete našim ďalším spokojným zákazníkom.

Tešíme sa na spoluprácu.

Vypracoval: Ján Andreides

V Ludrovej dňa 24.08.2007

TECHNOHALL SLOVAKIA s.r.o.
Ludrová 1
034 71

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Oprava strechy na objekte - Jankolu 10 - 16 | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Robstav stavebné družstvo Liptovský Mikuláš | 00168319 | SK2020428784 |
| | Rozpočet číslo / Spracoval | Dňa | |
| | Ing.Žuffa | 07.08.2007 | |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Rozpočtové náklady v SKK

| A | Základné rozp. náklady | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky 0 | 8 | Práca nadčas | 0 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0 |
| 2 | | Montáž 0 | 9 | Bez pevnej podl. | 0 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | 0 |
| 3 | PSV | Dodávky 215 029 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0 | 15 | Územné vplyvy | 0,00% | 0 |
| 4 | | Montáž 169 605 | 11 | | 0 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0 |
| 5 | "M" | Dodávky 0 | | | | 17 | Ostatné | 0,00% | 0 |
| 6 | | Montáž 0 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 384 634 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0 |
| 20 | HZS | 35 400 | 21 | Kompl. činnosť | 0 | 22 | Ostatné náklady | | 0 |

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

7.8.2007

Dátum a podpis

ROBSTAV STAVEBNÉ DRUŽSTVO DRUŽSTEVNÁ č. 6 031 14 LIPT. MIKULÁŠ IČO: 168319, IČ DPH: SK2020428784

Pečiatka

| D | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 420 033,80 |
| 24 | 19 % | 420 033,80 DPH | 79 806,40 |
| 25 | **Cena s DPH (ř. 23-24)** | | **499 840,20** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0 |

**Šiška Miroslav, Rázusova 3 , 036 01 MARTIN, Tel. 0905 229 025**

## Cenová ponuka opravy strechy na objekte - Jankolu 10 - 16.
## technológiou "BAUDER"

**Technický list:**

| Bauder Schwarte PYE PV 200 S 4 natur | |
|---|---|
| Povrch. úprava: | hore - bridlica |
| | dolu - fólia |
| Aplikácia: | natavovanie |
| Nosná vložka: | polyester. Rúno |
| Váha: | 4,8 kg/m2 |
| Hrúbka: | 4mm |
| Množstvo: | rola - 7,5m2 |
| Max. pevnosť v ťahu: | pozdĺžna - 800 N |
| | priečna - 800 N |
| Ťažnosť: | pozdĺžna - 35% |
| | priečna - 35% |
| Ohyb za studena: | - 25°C |
| Tepelná odolnosť: | + 100°C |

| Názov | 1 m2/Sk | m2 | Spolu |
|---|---|---|---|
| Oprava strechy + výspravky | 380 | 840 | 319 200 |
| Kašírovaný polystyrén 6 cm + mont. | 0 | 0 | 0 |

| Názov | m.j./Sk | bm /ks | Spolu |
|---|---|---|---|
| Demontáž atikových plechov | 110 | 161 | 17 710 |
| Montáž atikových plechov | 350 | 161 | 56 350 |
| Montáž odvetrávacích komínkov | 0 | 0 | 0 |
| Demont. mont. Bleskozvodu + revízia | 160 | 240 | 38 400 |
| Tmelenie studeným asfaltom BULDOG | 250 | 98 | 24 500 |
| Montáž strešných vtokov | 1500 | 5 | 7500 |

| | |
|---|---|
| Oprava strechy + výspravky | 319 200 |
| Výmena atik. plechov | 74 060 |
| Demont. mont. bleskozvodu | 38 400 |
| Tmelenie studeným asfaltom | 24 500 |
| Montáž odvetrávacích komínkov | 0 |
| Montáž strešných vtokov | 7500 |
| Spolu bez DPH | 463 660 |
| DPH 19% | 88 095 |
| **Spolu s DPH** | **551 755** |

**Referencie** A.Stodolu 44 -50, Martin - 750 m2, L. Hrádok-32 b.j.- 650 m2, Jedlíková 14 - 16 Žilina - 700m2
1 Čsl. Brigády 32 Vrútky 350 m2, Novojičinska 1-2 Martin 500 m2, Exnárova 3-4 360 m2

**Dodacia lehota:** 1 mesiac od objednávky
**Záručné podmienky:** 10 rokov
**Platnosť ponuky:** 3 mesiace

Vypracoval: Šiška Miroslav
V Martine dňa 08.08.2007.

Miroslav Šiška
Rázusova 3/4, 036 01 Martin
IČO: 34703861

NOVOIZOL s.r.o. Ján Gábrik, Hradná 530, 03301 Liptovský Hrádok

# *NÁVRH SANÁCIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA NA BUDOVE BYTOVÉHO DOMU NA UL JANKOLU 10-16 MARTIN.*

**Návrh obsahuje tieto časti:**

1.) **POPIS SÚČASNÉHO STAVU**
2.) **NÁVRCH SANÁCIE**
3.) **POPIS PRÁC**
4.) **POSTUP PRÁC**
5.) **CENA**
6.) **ZÁRUKA**
7.) **DOBA REALIZÁCIE**

**DODATKY:**

8.) **PODOBNÉ PRÁCE REALIZOVANÉ NAŠOU FIRMOU**

## 1.) CHARAKTERISTIKA A POPIS SÚČASNÉHO STAVU

**Opravu plášťa navrhujeme riešiť:**
celkovou opravou s aplikovaním novej jednovrstvovej hydroizolácie cez okrajové plechy s ich úplným prelepením a ukončením na vonkajšej strane ohybu.

## 2.) NÁVRH SANÁCIE:

Sanáciu strešných plášťov navrhujeme riešiť modifikovanými asfaltovými pásmi zahraničnej výroby (ČR) jednovrstvovým systémom - Polyelast extra design 4,6kg/m

## 3.) POPIS PRÁC:

Na takto vystavený podklad aplikujeme nový hydroizolačný systém. Súčasťou hydroizolačného systému je odvetranie strešného plášťa umelohmotnými odvetrávacími komínkami (obrázok pravo), ktoré zabezpačujú dokonalé spojenie z hydroizolačným pásom. Hustota komínkov je 1ks/50m$^2$ a sú napojené pod stávajúcu hydroizoláciu. Tieto umožnujú postupné vysušovanie a odvetrávanie celého strešného plášťa. Okrajové plechy prekryjeme novou vrstvou hydroizolácie, ktorá sa prelepí až cez ohyb na vonkajšej strane plechu. Dosiahne sa tým úplná vodotesnosť na prechode z vodorovnej a zvyslej plochy, dokonalá izolácia atiky a navyše odpadá starostlivosť o plechy. Ostatné stávajúce klampiarske konštrukcie nartieme syntetickou farbou. Po ukončení prác spätne zmontujeme jímaciu časť bleskozvodu do pôvodného stavu a podlepíme pätky.

## 3.) POSTUP PRÁC:

- vyčistenie strechy od nečistôt
- celú plochu strechy v prvom rade vysprávkujeme, poprezávame bubliny, vysušíme vodné vankúše a voľnú lepenku pritavíme k podkladu
- montáž systému odvetrávacích komínkov 1 ks/50m$^2$ s napojením pod pôvodnú hydroizoláciu
- montáž umelohmotných dažďových vpustí
- celoplošné natavenie vrchnej vrstvy v celej ploche strechy s prelepením detailov a obalením komínov a cez nové okrajové plechy s ich úplným prelepením a ukončením na vonkajšej strane ohybu

## 4.) CENA:

Cena realizácie a dodávky sanácie strešného plášťa je pevná, vyplatená po ukončení prác a odovzdaní diela objednávateľovi.

- Hydroizolačný systém Polyelast extra design 4,6kg/m$^2$

= 397 418,24 Sk + 19%DPH = 472927,70 Sk

## 5.) ZÁRUKA:

**Na prevedené práce a materiál v systéme Polyelast extra design 4,6kg/m², poskytujeme záruku v trvaní 120 mesiacov odo dňa ukončenia a prevzatia prác.**

## 6.) DOBA REALIZÁCIE:

**Odhadovaná doba realizácie 12 – 17 pracovných dní v termíne podľa dohody.**

*Firma NOVOIZOL počas svojho trvania neznamenala žiadnu reklamáciu na prevedené práce a na použitý materiál. Veríme že ai vv sa stanete našim ďalším spokojným zákazníkom*

*Ťešíme sa na spoluprácu*

NOVOIZOL
Ján Gábrik, tel: 0905 553 004
IČO: 36990353 DRČ:SK1020080897
Hradná 530, 033 01 Liptovský Hrádok
e-mail: novoizol@stonline.sk
Web: web.stonline.sk/novoizol
www.novoizol.sk

Vypracoval: Ján Gábrik
v Liptovskom Hrádku
dňa 28.8. 2007

# ZADANIE

**Stavba:** **Oprava strechy ul. Jankolu or. č. 10, 12, 14, 16, Martin**

**Zadávateľ:** **BARMO ul. gen. Viesta, 911 50 Trenčín** Dátum:

**Časť:** JKSO:


| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | |
| | | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | |
| 1 | 013 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | t | | | 3895,00 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | |
| | | **712** | **Izolácie striech** | | | | |
| 2 | 711 | | Oprava povlakovej krytiny na strechách plochých na 10% plochy | m2 | 86,000 | 15,20 | 1307,20 |
| 3 | 711 | | Očistenie povlakovej krytiny na 10% plochy | m2 | 86,000 | 15,90 | 1367,40 |
| 4 | 711 | | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých náterom penetračným | m2 | 857,000 | 35,00 | 29995,00 |
| *5* | *111* | | *Lak asfaltový penetračný* | *m2* | *857,000* | *29,00* | *24853,00* |
| 6 | 711 | | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých pásmi pritav. NAIP na celej ploche | m2 | 857,000 | 140,00 | 119980,00 |
| *7* | *628* | | *Pásy ťažké asfaltové modifikované, s bridlicovým posypom* | *m2* | *985,550* | *160,00* | *157688,00* |
| 8 | 711 | | Údržba strešných vpustov | ks | 5,000 | 45,00 | 225,00 |
| 9 | 711 | | Údržba prienikov vetracích komínkov | m2 | 857,000 | 3,50 | 2999,50 |
| 10 | 711 | | Údržba bleskozvodových nosičov | m2 | 857,000 | 2,82 | 2416,74 |
| 11 | 711 | | Presun hmôt | % | | | 3750,00 |
| | | **713** | **Izolácie tepelné** | | | | |
| 12 | 713 | | Osadenie odvetrávacích komínikov | m2 | 857,000 | 5,00 | 4285,00 |
| *13* | *628* | | *Odvetrávacie komínčeky* | *m2* | *857,000* | *5,20* | *4456,40* |
| *14* | *552* | | *Strešný vpust* | *ks* | *5,000* | *480,00* | *2400,00* |
| | | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | |
| 15 | 767 | | Strešné výlezy - oprava rebríkov, závesov, izolácia poklopov | ks | 4,000 | 7500,00 | 30000,00 |
| | | **OST** | **Ostatné** | | | | |
| 16 | HZS | HZS-004 | Nešpecifikované práce | hod | | | |
| 17 | 711 | | Dopravné | % | | | 7800,00 |

**Cena celkom bez DPH:** 397418,24

Cena s DPH: 472 927,70 SK

# REALIZOVANÉ PRÁCE PODOBNÉHO CHARAKTERU

Budova- Lipt. Mikuláš, Jilemn. 871
Plocha strechy- 705 $m^2$
Materiál- isobond- p 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 14 dní, jún 1999



Budova- Lipt. Hrádok, Hradná 495
Plocha strechy- 360 $m^2$
Materiál- isobond- p 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 7 dní, jún 1999



Budova- Lipt. Mikuláš, Senická 623
Plocha strechy- 448 $m^2$
Materiál- isobond- p 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 10 dní, jún 1999



Budova- Lipt. Mikuláš, Borbis. 1969
Plocha strechy- 660 $m^2$
Materiál- Pol. isobond- p 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 10 dní, noven. 2000




Budova- poliklinika mesta Zvolen
Plocha strechy- 3630 $m^2$
Materiál- kappa- v 4kg/$m^2$
Doba realizácie- 17 dní, jún 1999



Budova- L.M. zdr. garáže Podbr.
Plocha strechy- 1455 $m^2$
Materiál- 2x kappa- v 4kg/$m^2$
Doba realizácie- 8 dní, nov. 2000



Budova- Liptovský Hrádok, MSKS
Plocha strechy-2800 $m^2$
Materiál- isoplan 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 15 dní, nov. 2000



Budova- Lipt. Mikuláš, Hr. 155
Plocha strechy- 400 $m^2$
Materiál- isoplan 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 5 dní, sept. 2001



Budova- Lipt. Hrádok Energovod
Plocha strechy- 450 $m^2$
Materiál- index argo- p 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 5 dní, dec. 2002




Budova- Ružomberok SCP a.s.
Plocha strechy- 18 000 $m^2$
Materiál- fiberpol 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 2001-2003



Budova- novost. Barandov Praha.
strechy- 9 800 $m^2$ Plocha
Materiál- 2x graviflex 4,5 Kg/$m^2$,pol.
Doba realizácie- 45 dní jún, sep. 2003




Budova- novost. Barandov Praha Plocha
strechy- 4 500 $m^2$
Materiál- 2x grav. 4 Kg/$m^2$,dlažba
Doba realizácie- 25 dní jún,júl 2003




Budova- LM Jednota- predajne
Plocha strechy- 4 500 $m^2$
Materiál- fiberpol 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 2004



Budova- Martin, Hydac s.r.o.
Plocha strechy- 550 $m^2$
Materiál- 2x fiberpol 4,5kg/$m^2$, pol.
Doba realizácie- 5 dní júl 2004



Budova- rodinné domy na slovensku
Plocha strechy- 20 000 $m^2$
Materiál- fiberpol 4,5kg/$m^2$, polyst.
Doba realizácie- 1999-2005



Budova- Ružomberok Vrkol. ul.
Plocha strechy- 360 $m^2$
Materiál- fiberpol 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 5 dní 2004



Budova- Harmanec Papierne a. s.
Plocha strechy- 550 $m^2$
Materiál- 2x fiberpol 4,5kg/$m^2$, polyst.
Doba realizácie- 5 dní 2004



Budova- Ružomberok Papieren. ul.
Plocha strechy- 2 200 $m^2$
Materiál- fiberpol 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 15 dní 2004



Budova- Dolný Kubín bytový dom
Plocha strechy- 450 $m^2$
Materiál- 2x fiberpol 4kg/$m^2$, polyst.
Doba realizácie- 7 dní novem. 2004



Budova- Lipt. Hrádok Hradná 530
Plocha strechy- 390 $m^2$
Materiál- fiberpol 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 7 dní novemb. 2004




Budova- poliklinika v Lipt. Osade
Plocha strechy – 820 $m^2$
Materiál- fiberpol 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 12 dní dec. 2004



Budova- Liptovský Hrádok Sady 68
Plocha strechy- 260 $m^2$
Materiál- fiberpol 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 4 dni novemb. 2004



Budova- Ružomberok Pol'ná ul.
Plocha strechy- 860 $m^2$
Materiál- 2x rowergom 4,5kg/$m^2$, pol.
Doba realizácie- 8 dni jún 2005



Budova- Lipt. Hrádok J.D.Matejov.
Plocha strechy- 470 $m^2$
Materiál- fiberpol 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 10 dní júl 2005



Budova- Z Š Zarevúca
Plocha strechy- 860 $m^2$
Materiál- prima dekor 4,5kg/$m^2$
Doba realizácie- 15 dní jún 2005



Budova- garáže Bratislava
Plocha strechy- 1200 $m^2$
Materiál- rowergom 5kg/$m^2$
Doba realizácie- 10 dní júl 2005



# *Cenová ponuka - rekonštrukcia strešného plášťa*

**Zadávateľ:** Barmo, ul.gen.Viesta, 911 50 Trenčín

**Názov objektu :** budova - ul.Jankolu 10,12,14,16 Martin

**Mesto :** Martin

**Stavebné práce :** Rekonštrukcia strešného plášťa

**Termín realizácie :** do 14 dní od zahájenia prác

**Zhotoviteľ:** GARS s.r.o., M.M. Hodžu 20, 031 01 Liptovský Mikuláš

**Kontakt:** Ing. Ivan Jaroš, tel. 0903 557839

**Platnosť ponuky**: do 31.12.2007

GARS s.r.o.
GEODETICKÁ A KATASTRÁLNO STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
Ul. M.M. Hodžu 20
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
DIČ: SK2020420004 č.ú.: 535 040-342/0200

# ZADANIE

**Stavba:** Oprava strechy ul. Jankolu or. č. 10, 12, 14, 16, Martin
**Zadávateľ:** BARMO ul. gen. Viesta, 911 50 Trenčín
**Časť:**
Dátum:
JKSO:

GEODETICKÁ ... STAVEBNÁ
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
DIČ: SK20... IČO: 535 046 342/0200

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | |
| | | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | |
| 1 | 013 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | t | | | 5200,00 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | |
| | | **712** | **Izolácie striech** | | | | |
| 2 | 711 | | Oprava povlakovej krytiny na strechách plochých na 10% plochy | m2 | 86,000 | 20,00 | 1720,00 |
| 3 | 711 | | Očistenie povlakovej krytiny na 10% plochy | m2 | 86,000 | 23,50 | 2021,00 |
| 4 | 711 | | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých náterom penetračným | m2 | 857,000 | 45,50 | 38993,50 |
| *5* | *111* | | *Lak asfaltový penetračný* | *m2* | *857,000* | *33,70* | *28880,90* |
| 6 | 711 | | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých pásmi pritav. NAIP na celej ploche | m2 | 857,000 | 145,00 | 124265,00 |
| *7* | *628* | | *Pásy ťažké asfaltové modifikované, s bridlicovým posypom* | *m2* | *985,550* | *153,00* | *150789,15* |
| 8 | 711 | | Údržba strešných vpustov | ks | 5,000 | 39,00 | 195,00 |
| 9 | 711 | | Údržba prienikov vetracích komínkov | m2 | 857,000 | | |
| 10 | 711 | | Údržba bleskozvodových nosičov | m2 | 857,000 | 3,50 | 2999,50 |
| 11 | 711 | | Presun hmôt | % | | | |
| | | **713** | **Izolácie tepelné** | | | | |
| 12 | 713 | | Osadenie odvetrávacích komínikov | m2 | 857,000 | 4,50 | 3856,50 |
| *13* | *628* | | *Odvetrávacie komínčeky* | *m2* | *857,000* | *6,50* | *5750,50* |
| *14* | *552* | | *Strešný vpust* | *ks* | *5,000* | *450,00* | *2250,00* |
| | | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | |
| 15 | 767 | | Strešné výlezy - oprava rebríkov, závesov, izolácia poklopov | ks | 4,000 | 8350,00 | 33400,00 |
| | | **OST** | **Ostatné** | | | | |
| 16 | HZS | HZS-004 | Nešpecifikované práce | hod | | | 17520,00 |
| 17 | 711 | | Dopravné | % | | | 8500,00 |

**Celkom bez DPH** 426341,05

s DPH: 507 345,84

**Platobné podmienky** : do 30 dní od vystavenia faktúry

**Doba realizácie**: do 14 dní , podľa počasia

**Záruka:** 10 rokov od prebratia diela

GEODETICKÁ A BANSKÁ SPRÁVA
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
DIČ: SK2020420004

Zoznam výpisov č.:

# VÝPIS
# Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Žilina
k dátumu 28.09.2006

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 15280/L

*prvý výpis nepodlieha poplatku*

## I. OBCHODNÉ MENO

TECHNOHALL SLOVAKIA, s.r.o.

## II. SÍDLO

**Názov obce:** Ludrová 1
**PSČ:** 034 71

**III. IČO:** 36 421 286

**IV. DEŇ ZÁPISU:** 24.07.2004

**V. PRÁVNA FORMA:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

## VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
2. - maliarske, natieračské a sklenárske práce
3. - predaj nápojov na priamu konzumáciu
4. - predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
5. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
6. - reklamné činnosti
7. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
9. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
10. - prekladateľské a tlmočnícke služby
11. - prenájom automobilov
12. - prenájom bytov, domov, obchodov a konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
13. - sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
14. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien

## VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

**Meno a priezvisko:** Ján Andreides
**Bydlisko:**
**Názov obce:** Ludrová 1
**Dátum narodenia:** 25.02.1966
**Rodné číslo:** 660225/6067

**Vznik funkcie:** 24.07.2004

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:**
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

# AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

## Ing. Ivan Jaroš

rodné číslo **610408/6241** zložil dňa **13.6.2001** sľub podľa § 23 zákona č. 138/1992 Zb.
v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov

pod číslom **1115** ako

## Autorizovaný stavebný inžinier

pod registračným číslom **1115*A*4-1** v kategórii **Stavebné konštrukcie**

s rozsahom oprávnenia **Projektovanie pozemných stavieb**

a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

**25.6.2001**
Dátum vydania

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV * BRATISLAVA *

**Ing. Ján Kyseľ**
Predseda SKSI

*TECHNOHALL SLOVAKIA s.r.o.*

STAVBY A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA STRIECH
IZOLÁCIE , TEPELNÉ IZOLÁCIE,
HYDROIZOLÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ

# Oprava plochej strechy
# Martin, ul.Jankolu 10-16


**Zadávateľ :**
BARMO
Hviezdoslavova 2
Liptovský Mikuláš
p.Martinisková

**Dodávateľ:**
Technohall Slovakia s.r.o.
Ludrová 1
034 71
IČO: 36421286
DIČ: SK2021862700


## 1,NÁVRH OPRAVY STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Opravu strešného plášťa navrhujeme riešiť celoplošným aplikovaním novej hydroizolácie v jednej vrstve, s pretavenim cez atikové plechy a ukončením na vonkajšej hrane presahu. Tým sa dosiahne bezúdržbovosť plechov.
Ópravu strešného plášťa navrhujeme riešiť modifikovanými asfaltovými pásmi od firmy TECHNONIKOL :
**MIDA TOP PV S4** – hydroizolačný asfaltový nataviteľný pás hr. 4,2 mm z SBS modifikovaného asfaltu, s perforovanou mikroténovou fóliou na spodnej strane, bridlicovým posypom na hornej strane a nosnou vložkou z polyesterovej rohože kombinovanej so sklenenou mriežkou.
Je vhodný pre strešné plášte všetkých sklonov. Hydrofobizovaný bridlicový posyp dostatočne chráni hydroizolačný materiál pred všetkými klimatickými vplyvmi.
**Technické parametre** a **vyhlásenie zhody** sú priložené k cenovej ponuke.

## 2, POPIS PRÁC .

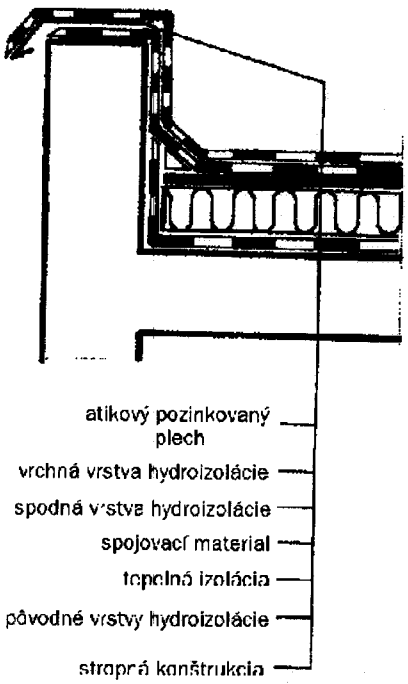


Celá plocha strechy bude očistená. Vzduchové bubliny budú prerezané a poškodené miesta budú vyspravené.Na takto pripravený podklad bude aplikovaná nová hzdroizolácia z modifikovaného asfaltového pásu MIDA TOP PV S4, ktorý bude pretavený cez atikové plechy a ukončený na vonkajšej strane presahu. Súčasťou hydroizolačného systému je odvetranie strešného plášťa umelohmotnými odvetrávacími komínkami (obrázok v pravo), ktoré zabezpečujú dokonalé spojenie s hydroizolačným pásom. Hustota komínkov je 1ks/50m$^2$. Tieto umožňujú postupné vysušovanie a odvetrávanie celého strešného plášťa.

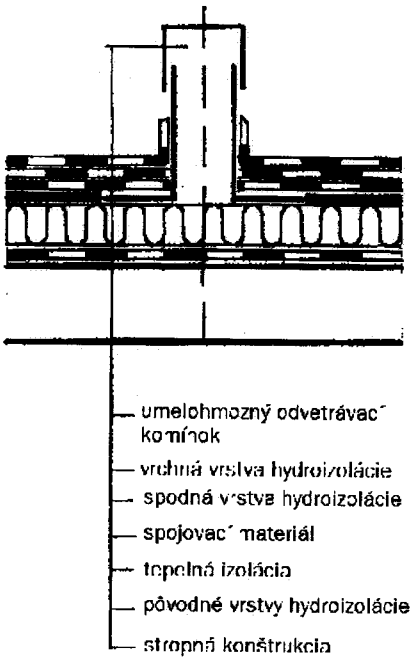


Okrajové atikové plechy prekryjeme novou vrstvou hydroizolácie (obr. v ľavo), ktorá sa prelepí až cez ohyb na vonkajšej strane plechu. Dosiahne sa tým úplná vodotesnosť na prechode z vodorovnej a zvislej plochy, dokonalá izolácia atiky a navyše odpadá starostlivosť o plechy. Po ukončení prác spätne zmontujeme jímaciu časť bleskozvodu do pôvodného stavu a podlepíme pätky.

**Strešné výlezy** : Demontáž pôvodných ( poškodených ) pántov. Zosilenie konštrukcie výlezu pásovinou a montáž nových pántov, penetrácia a prelepenie plechu MIDA TOP PVS4.

## 3,POSTUP PRÁC:

- Očistenie strechy a pripravenie podkladu
- Prerezanie vzduchových vankúšov
- Vyspravenie poškodených miest
- Inštalácia nového jednovrstvového hydroizolačného systému v celej ploche strechy s prelepením okrajových plechov na vonkajšej strane ohybu a prelepením vetracích šachiet
- montáž systému odvetrávacích komínkov 1 ks/50m$^2$
- počas prác čiastočná demontáž bleskozvodu
- podlepenie pätiek bleskozvodu
- odvoz odpadu a vyčistenie staveniska

**CENA:**

Cena na 1 m2 bez DPH..... 351,55 Sk

Cena spolu bez DPH..... 301 281,45 Sk
DPH 19%..... 57 243,39 Sk
**Cena spolu s DPH..... 358 524,84 Sk**

**PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY:**

Cena vyplatená na základe vystavenej faktúry, splatnosť 14 dní od jej vystavenia.
Doba realizácie: 6 – 12 dní v závislosti od počasia.
Všetky použité materiály sú certifikované.

**ZÁRUKA:**

Na prevedené práce a materiál poskytujeme záruku v trvaní **120 mesiacov** odo dňa ukončenia a prevzatia prác.

**PLATNOSŤ PONUKY :**

do 31.12.2007.

Firma Technohall Slovakia s.r.o. počas svojho trvania nezaznamenala žiadnu reklamáciu na prevedené práce a na použitý materiál. Veríme, že aj vy sa stanete našim ďalším spokojným zákazníkom.

Tešíme sa na spoluprácu.

Vypracoval: Ján Andreides

V Ludrovej dňa 24.08.2007

TECHNOHALL SLOVAKIA s.r.o.
Ludrová 1
034 71

# ZADANIE

**Stavba:** **Oprava strechy ul. Jankolu or. č. 10, 12, 14, 16, Martin**

**Zadávateľ:** **BARMO ul. gen. Viesta, 911 50 Trenčín** Dátum:

**Časť:** JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | |
| | | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | |
| 1 | 013 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | t | | | 4800,00 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | |
| | | **712** | **Izolácie striech** | | | | |
| 2 | 711 | | Oprava povlakovej krytiny na strechách plochých na 10% plochy | m2 | 86,000 | 95,34 | 8200,00 |
| 3 | 711 | | Očistenie povlakovej krytiny na 10% plochy | m2 | 86,000 | 12,20 | 1050,00 |
| 4 | 711 | | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých náterom penetračným | m2 | 857,000 | 10,00 | 8570,00 |
| *5* | *111* | | *Lak asfaltový penetračný* | *m2* | *857,000* | *13,24* | *11354,50* |
| 6 | 711 | | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých pásmi pritav. NAIP na celej ploche | m2 | 857,000 | 105,00 | 89985,00 |
| *7* | *628* | | *Pásy ťažké asfaltové modifikované, s bridlicovým posypom* | *m2* | *985,550* | *133,31* | *131383,86* |
| 8 | 711 | | Údržba strešných vpustov | ks | 5,000 | 50,40 | 252,00 |
| 9 | 711 | | Údržba prienikov vetracích komínkov | m2 | 857,000 | 2,06 | 1767,00 |
| 10 | 711 | | Údržba bleskozvodových nosičov | m2 | 857,000 | 1,82 | 1559,74 |
| 11 | 711 | | Presun hmôt | % | | | 3213,75 |
| | | **713** | **Izolácie tepelné** | | | | |
| 12 | 713 | | Osadenie odvetrávacích komínikov | m2 | 857,000 | 2,06 | 1767,00 |
| *13* | *628* | | *Odvetrávacie komínčeky* | *m2* | *857,000* | *4,80* | *4113,60* |
| *14* | *552* | | *Strešný vpust* | *ks* | *5,000* | *400,00* | *2000,00* |
| | | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | |
| 15 | 767 | | Strešné výlezy - oprava rebríkov, závesov, izolácia poklopov | ks | 4,000 | 6241,25 | 24965,00 |
| | | **OST** | **Ostatné** | | | | |
| 16 | HZS | HZS-004 | Nešpecifikované práce | hod | | | 0,00 |
| 17 | 711 | | Dopravné | % | | | 6300,00 |

**Celkom** 301281,45

DPH 19%: 57243,39

Cena s DPH: 358 524,84 Sk

# TECHNICKÉ PARAMETRE

**Charakteristiky výrobku:**

| Č. | Vlastnosť | Merná jednotka | Hodnota | Skúšobná metóda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viditeľné defekty | ---------- | Bez viditeľných defektov | STN-EN 1850-1:2002 |
| 2. | Dĺžka | M | ≥ 7,5 | STN-EN 1848-1:2002 |
| 3. | Šírka | M | ≥ 1,0 | STN-EN 1848-1:2002 |
| 4. | Pravouhlosť | ---------- | Odklon od pravých uhlov nemôže prevyšovať 15 mm/ na 7,5 m dĺžky alebo proporcionálne podľa iných dĺžok | STN-EN 1848-1:2002 |
| 5. | Hrúbka | MM | 4,2 ± 0,2 | STN-EN 1849-1:2002 |
| 6. | Vodonepriepustnosť pri tlaku 100 kPa v priebehu 24 hod. | ---------- | Neprepúšťa vodu | STN-EN 1928:2002 metóda B |
| 7. | Trieda reakcie na oheň | ---------- | Trieda E | STN-EN 13501-1:2004 |
| 8. | Tržné zaťaženie<br>- v pozdĺžnom smere<br>- v priečnom smere | N/50MM | <br>800 ±100<br>600 ±100 | STN-EN 12311-1:2001 |
| 9. | Pomerné predĺženie<br>-v pozdĺžnom smere<br>-v priečnom smere | % | <br>40 ± 10<br>40 ± 10 | STN-EN 12311-1:2001 |
| 10. | Ohybnosť pri nízkych teplotách | ° C | ≤ -20 | STN-EN 1109:2001 |
| 11. | Tepelná odolnosť (odolnosť proti stekaniu pri zvýšených teplotách) | °C | ≥ +100 | STN-EN 1110:2001 |
| 12. | Rozmerová stabilita | % | ≤ 5 | STN –EN 1107-1 metóda A |
| 13. | Difúzny odpor | μ | 20 000 | STN – EN 1931:2002 |

ITECO spol. s r.o.

TECHNO NICOL

# SK - Vyhlásenie zhody

CE

1. Výrobca/závod: **OOO «TECHNOFLEX»**
**Prizheleznodorozhnaja 5, 390042 RJAZAŇ**
**Ruská federácia**

2. Splnomocnený zástupca výrobcu: **ITECO spol. s r.o.**
**Kamenná 51,**
**010 01 Žilina**
**Slovenská republika**

3. Názov stavebného výrobku: **Asfaltovaný hydroizolačný pás MIDA TOP PV S4**

4. Opis stavebného výrobku: **Hydroizolačný asfaltovaný pás MIDA TOP PV S4 sa vyrába impregnáciou polyesterovej rohože kombinovanej so sklenenou mriežkou SBS elastomérom modifikovaným asfaltom s asfaltovou krycou vrstvou. Ako vrchná vrstva pásu je aplikovaný hrubozrnný minerálny posyp, na spodnej vrstve pásu je polymérna fólia.**

5. Účel a spôsob použitia stavebného výrobku:
**Vrchný nataviteľný pás pre nové aj rekonštruované strešné plášte a ostatné izolačné systémy . Nie je vhodný pre strešné záhrady a na jednovrstvové aplikácie.**

6. Technická špecifikácia:

**STN-EN 13707 Hydroizolačné pásy a fólie.. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky.**

7. Informácia o notifikovanej skúšobni a certifikáte:

**Č. 1486, Centralny Osrodek Badawczo – Rozwojowy Przemyslu Izolacji Budowlanej , Biuro Certyfikacji, al. W. Korfantego 193, 40-157 Katowice, Poland.**
**Cerifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1486 – CPD - 0118**

V Žiline dňa:

08.02.2007

ITECO spol. s r.o.
Kamenná 51
010 01 ŽILINA
Tel./Fax: 041/5624 697
IČO: 31574645 IČ DPH: SK2020442908

Ing. Gjabel Daniel
Konateľ spoločnosti
ITECO spol. s r.o.

# TECHNOHALL SLOVAKIA s.r.o.

## referencie

Firma **Technohall Slovakia s.r.o.** bola založená v roku 2004 ako pokračovateľ firmy Technohall s.r.o. Toto odčlenenie si vyžadovali stále sa rozširujúce stavebno-obchodné činnosti, ktorými sa firma Technohall s.r.o. zaoberala.
Hlavná činnosť firmy **Technohall Slovakia s.r.o.** sa vyprofilovala hlavne na komplexnú realizáciu hydroizolácie plochých striech, generálne opravy a zateplenie plochých striech, lokálne vysprávky poškodených miest ako aj na realizáciu zateplovacieho systému stien budov.
Naša firma veľmi úzko spolupracuje s viacerými dodávateľmi izolácií a strešných krytín a sama sa aj zaoberá distribúciou modifikovaných asfaltových pásov.
Generálne opravy plochých striech sú uskutočňované „ na kľúč“ – od posúdenia daného stavu strechy, cez vypracovanie cenovej ponuky, dodanie materiálu a realizáciu objednanej opravy, likvidáciu odpadov.
Pri výbere strešnej krytiny a doplnkov zaisťujeme bezplatné poradenstvo.
V závislosti od použitých materiálov poskytujeme na nami prevedené práce 36 až 120 mesačnú záruku.


Najvýznamnejšie referencie:

1. FKH – Electronic **7000 m²**
2. Obytné domy pre SBD a SVBD **12000 m²**
3. Sklady pre MATADOR Púchov v RBK **1 170** m²
4. SCP – 6 PS **1450m²**
5. Sklad odbytu SOLO SCP Ružomberok **2540m²,**
6. Južná rampa a 8PS Ružomberok **3500m²**
7. Úpravňa SCP **9 350m²**(fólia)
8. Solo , MTZ a PHM **3 300 m²**
9. Heighland Stupava **2500 m²**
10. Zetor a.s. Brno **17 000 m²**
11. Martin, Hydac s.r.o. **550 m2**
12. Budova- poliklinika v Liptovskej Osade **820 m2**
13. Budova- Harmanec Papierne a. s. **550 m2**
14. Budovy predajní COOP jednota a.s., okres Ružomberok **2000 m2**
15. Hala SONY Nitra **30000 m²**

**SONY Nitra 30000 m² - realizácia február – apríl 2007**



# ZETOR a.s., Brno 17000 m² - realizácia júl, august 2006, november 2006 máj-júl 2007

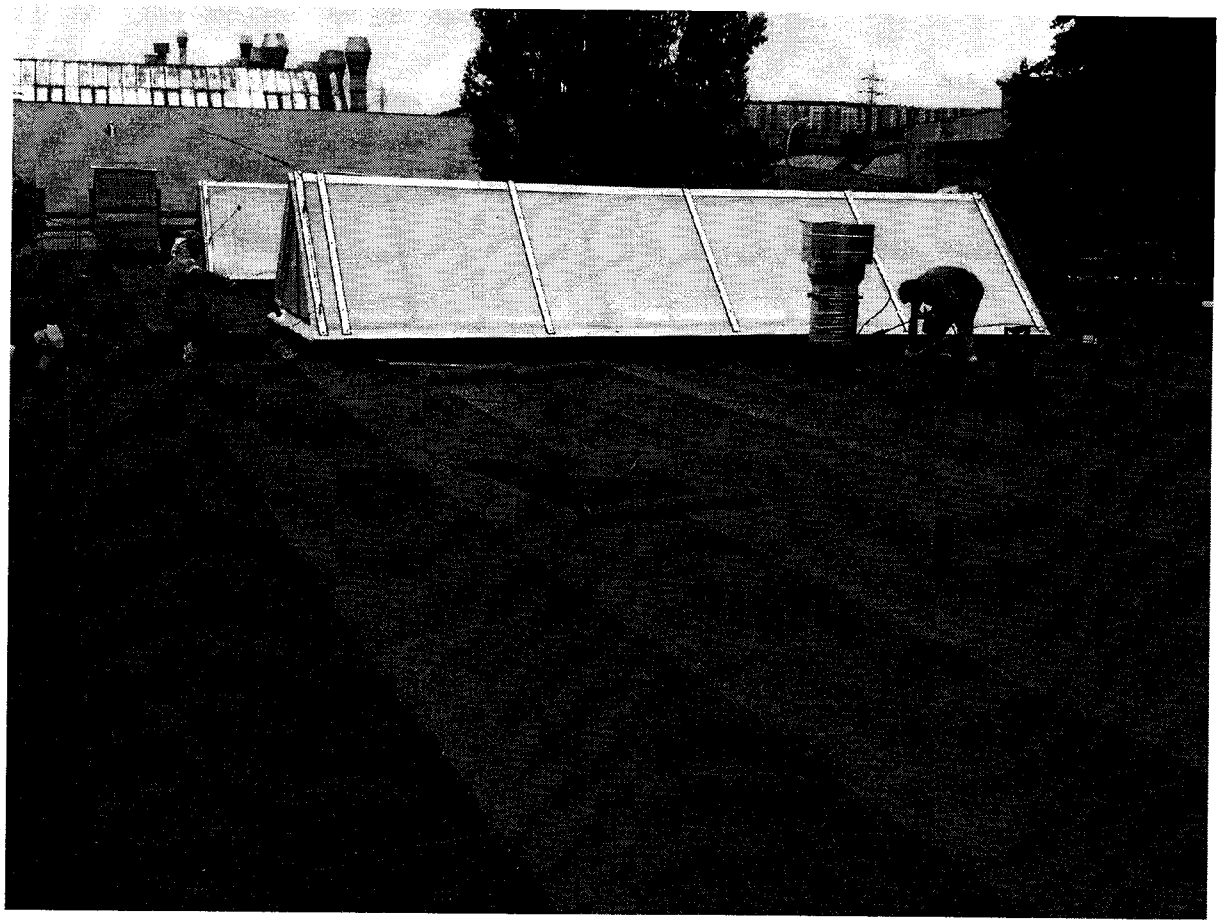

*TECHNOHALL SLOVAKIA s.r.o.*

STAVBY A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA STRIECH
IZOLÁCIE , TEPELNÉ IZOLÁCIE,
HYDROIZOLÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Obchodný názov spoločnosti: **Technohall Slovakia s.r.o.**
Adresa spoločnosti: **Ludrová 1, 034 71 Ludrová**
Kontaktná osoba: **Ján Andreides**
Mobil: **0905/289 153**
e.mailová adresa: technohall@technohall.sk
web.stránka: www.technohall.sk
IČO: **36 421 286**
DIČ: **2021862700**
Bankové spojenie: **ČSOB a.s., Ružomberok**
Číslo účtu: **4001580965/7500**
IBAN: **SK51 7500 0000 0040 0158 0965**
**SWIFT:** **CEKOSKBX**

Dodávateľ:

TECHNOHALL SLOVAKIA
Ludrová 1
034 71 Ludrová

IČO: 36421286
DIČ: 2021862700
IČ DPH: SK2021862700

# Faktúra č.: 07VF0054

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 070054
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky: ZoD č.071001/9901/004
Dodací list č.:

Odberateľ:

**Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany**
**Ul.gen.Viesta 7**
**911 50 Trenčín**

IČO: 34000666
DIČ: 2021352388

Dátum dodania: 20.11.2007
Dátum vystavenia: 20.11.2007
Dátum splatnosti: **20.12.2007**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: ČSOB a.s.
Pobočka: Ružomberok
Číslo účtu: **4001580965/7500**
IBAN:
SWIFT:

Prevádzka:

Na základe ZoD č.071001/9901/004 z 19.10.2007 Vám fakturujeme dielo :
"Martin - oprava strechy M.Jankolu 10,12,14,16"

| Číslo | Názov | Množstvo | MJ | Zľava | Cena/MJ | Spolu | JC s DPH | DPH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099 | oprava strechy | 1,000 | ks | | 301 281,450 | 301 281,50 | 358 525,00 | 19 |

**Rekapitulácia DPH:**

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|---|---|---|
| 0% | 0,00 | |
| % | 0,00 | 0,00 |
| 19% | 301 281,50 | 57 243,50 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 358 525,00
Záloha: 0,00
**K úhrade: 358 525,00 SKK**

Nedostatky neboli ~~(boli)~~ zistené.
Účtovný doklad povoľujem
~~(nepovoľujem)~~ uhradiť.

Dátum: 30 NOV. 2007

Podpis podľa podpisového vzoru:

Tel.číslo: 044/4331558
WWW:
Vystavil: Andreidesová

TECHNOHALL SLOVAKIA s.r.o.
Ludrová 1
034 71

Podpis a pečiatka

Prevzal:

BARMO
OBLASTNÁ SPRÁVA
DOMOVÉHO A BYTOVÉHO FONDU 33
Hviezdoslavova č. 2
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Podpis a pečiatka

EXALOGIC (c) http://www.exalogic.sk

# ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA

## I.

1.1 **Objednávateľ - odovzdávajúci:** **Bytová agentúra rezortu MO SR**
**ul. gen,. Viesta 7**
**911 50 TRENČÍN**

- zastúpený: Meno, priezvisko, funkcia:

Ing. Oľga Martinisková vedúca OSDaBF
Miroslav Šiška technik SDaBF Martin

1.2 **Zhotoviteľ- preberajúci:** **Technohall Slovakia s.r.o.**

**034 71 Ludrová 1**

- zastúpený: Meno, priezvisko, funkcia:

- konateľ Ján Andreides

1.3 V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. 071001/9901/004, článku 6 Povinnosti objednávateľa ods. 6.1 sa uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska (miesta realizácie) za účelom zhotovenia diela:

**Stavba:** **Martin – oprava strechy Jankolu 10,12,14,16**

Miesto stavby: Jankolu 10,12,14,16, Martin
Kraj: Žilinský

## II.

2.1 Objednávateľ odovzdáva stavenisko v zmluvne určenej lehote, vypratané a v stave spôsobilom na zhotovenie diela v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie, stavebným povolením a podmienkami zmluvy.

2.2 Stavenisko je prístupné a nie je zaťažené činnosťou tretej osoby.

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko dnešným dňom preberá.

## III.

3.1 Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska vyčlenil na svojom pozemku dočasnú skládku odpadov s možným prístupom na dobu realizácie diela.

3.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela užívať stavenisko bezplatne (ZoD, článok 9,Odovzdanie a prevzatie staveniska, ods. 9.2)

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odber elektrickej energie a vody, vzhľadom k minimálnemu odberu pre zhotovenie uvedených prác bude v prospech zhotoviteľa bezplatný.

Tento zápis je vyhotovený v dvoch výtlačkoch, 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

V Martine dňa 24. 10. 2007

B A R M
OBLASTNÁ SPRÁVA
DOMOVÉHO A BYTOVÉHO FONDU
Hviezdoslavova č. 2
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

.....
za objednávateľa

.....
za zhotoviteľa

# PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE

| Stavebník (názov, sídlo, odtlačok pečiatky) | Číslo zápisu |
|---|---|
| **Bytová agentúra rezortu MO<br>Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín** | 33/7 |

| Dátum začatia preberacieho konania | Názov verejnej práce |
|---|---|
| **20. novembra 2007** | **Martin, ul. Jankolu 10-16 – oprava plochej strechy** |

**Názov dokončenej verejnej práce**

**Martin, ul. Jankolu 10-16 – oprava plochej strechy**

Opis

Realizáciou predmetnej verejnej práce bola oprava strechy na bytovom dome M. Jankolu 10,12,14,16, Martin z dôvodov nadmerného zatekania do bytov v uvedených vchodoch.

Kapacity získané výstavbou

a) obytné budovy Ø
- počet bytov
- obytná plocha v m2 Ø
- úžitková plocha v m2 Ø
- kapacita bytov Ø

b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových) Ø

| Zodpovedný stavbyvedúci | Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník |
|---|---|
| | Technohall Slovakia s.r.o. 034 71 Ludrová 1 |
| Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie) | Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí) |
| Stavebný dozor | |

Stavebné povolenie č. zo dňa vydal

V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa nevyžaduje.

Zmena stavebného povolenia č. zo dňa vydal

Ø

Zmluva podľa Obchodného zákonníka zo dňa

Zmluva o dielo č. 071001/9901/004 zo dňa 2007

| Dátum začatia prác podľa zmluvy | Dátum skutočného začatia prác | Dátum dokončenia prác podľa zmluvy |
|---|---|---|
| 24. októbra 2007 | 24. októbra 2007 | 7. novembra 2007 |

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce

Lehoty boli dodržané.

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvod

Nie sú.

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

| |
|---|
| Práce boli zrealizované v zmysle technických špecifikácií, STN, všeobecne záväzných predpisov platných v dobe zhotovenia. |
| Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti<br>Nie sú. |
| Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a nedostatkov na verejnej práci alebo jej dokončenej časti<br>Nie sú potrebné. |
| Zadržaná suma z dohodnutej ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov v percentách<br>Ø |
| Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky<br>Ø |
| Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia<br>Nie sú požadované. |
| Termín úplného vypratania staveniska 7. novembra 2007 |
| Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o usporiadaní vzájomných práv a nárokov<br>Nie sú potrebné. |
| ÚDAJE O PREVZATÍ DOKUMENTÁCIE |
| Doklady vydané v priebehu výstavby:<br>Ø |

| | |
|---|---|
| Cena podľa zmluvy a dodatkov | Sk<br>358 524, 84 Sk |
| Zľava z ceny a jej dôvody | Sk<br>0, 00 Sk |
| Cena po odpočítaní zľavy | Sk<br>358 524, 84 Sk |

| | | |
|---|---|---|
| Úroky z omeškania a zmluvné pokuty podľa zmluvy, resp. podľa Obchodného zákonníka<br>Ø | Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v Sk spolu<br>Ø | Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do<br>20. 11. 2007 |

| |
|---|
| Záručná lehota (konečný dátum)<br>V zmysle objednávky, ZoD na 5 rokov – t.j. do **20. novembra 2012** |
| Dátum skončenia preberacieho konania<br>**20. novembra 2007** |

| Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka | | | |
|---|---|---|---|
| | Meno a priezvisko | Funkcia | Podpis |
| Zástupcovia zhotoviteľa | Technohall Slovakia s.r.o.<br>Ján Andreides<br>034 71 Ludrová 1 | konateľ | |
| Zástupcovia stavebníka | Ing. Oľga Martinisková<br>Miroslav Šiška | vedúca OSDaBF<br>technik SDaBF Martin | |
| Ostatní prizvaní účastníci | | | |
| Rozdeľovník<br>1 x zhotoviteľ<br>4x stavebník | | | |

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole Nedostatky **neboli** (~~boli~~) zistené.

Dátum: 21.11.07 Podpis podľa podpisového vzoru:

# PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE

| Stavebník (názov, sídlo, odtlačok pečiatky) | Číslo zápisu |
|---|---|
| **Bytová agentúra rezortu MO<br>Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín** | **33/7** |

| Dátum začatia preberacieho konania | Názov verejnej práce |
|---|---|
| **20. novembra 2007** | **Martin, ul. Jankolu 10-16 – oprava plochej strechy** |

**Názov dokončenej verejnej práce**

**Martin, ul. Jankolu 10-16 – oprava plochej strechy**

Opis

Realizáciou predmetnej verejnej práce bola oprava strechy na bytovom dome M. Jankolu 10,12,14,16, Martin z dôvodov nadmerného zatekania do bytov v uvedených vchodoch.

Kapacity získané výstavbou

a) obytné budovy Ø

- počet bytov
- obytná plocha v m2 Ø
- úžitková plocha v m2 Ø
- kapacita bytov Ø

b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových) Ø

| Zodpovedný stavbyvedúci | Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník |
|---|---|
| | Technohall Slovakia s.r.o. 034 71 Ludrová 1 |
| Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie) | Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí) |
| Stavebný dozor | |

Stavebné povolenie č. zo dňa vydal

V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa nevyžaduje.

Zmena stavebného povolenia č. zo dňa vydal

Ø

Zmluva podľa Obchodného zákonníka zo dňa

Zmluva o dielo č. 071001/9901/004 zo dňa 2007

| Dátum začatia prác podľa zmluvy | Dátum skutočného začatia prác | Dátum dokončenia prác podľa zmluvy |
|---|---|---|
| 24. októbra 2007 | 24. októbra 2007 | 7. novembra 2007 |

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce

Lehoty boli dodržané.

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvod

Nie sú.

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

Práce boli zrealizované v zmysle technických špecifikácií, STN, všeobecne záväzných predpisov platných v dobe zhotovenia.

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti

Nie sú.

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a nedostatkov na verejnej práci alebo jej dokončenej časti

Nie sú potrebné.

Zadržaná suma z dohodnutej ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov v percentách

Ø

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky

Ø

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia

Nie sú požadované.

Termín úplného vypratania staveniska 7. novembra 2007

Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o usporiadaní vzájomných práv a nárokov

Nie sú potrebné.

ÚDAJE O PREVZATÍ DOKUMENTÁCIE

Doklady vydané v priebehu výstavby:

Ø

| | |
|---|---|
| Cena podľa zmluvy a dodatkov | Sk 358 524, 84 Sk |
| Zľava z ceny a jej dôvody | Sk 0, 00 Sk |
| Cena po odpočítaní zľavy | Sk 358 524, 84 Sk |

| | | |
|---|---|---|
| Úroky z omeškania a zmluvné pokuty podľa zmluvy, resp. podľa Obchodného zákonníka<br>Ø | Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v Sk spolu<br>Ø | Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do<br>20. 11. 2007 |

Záručná lehota (konečný dátum)
V zmysle objednávky, ZoD na 5 rokov – t.j. do **20. novembra 2012**

Dátum skončenia preberacieho konania **20. novembra 2007**

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka

| | Meno a priezvisko | Funkcia | Podpis |
|---|---|---|---|
| Zástupcovia zhotoviteľa | Technohall Slovakia s.r.o.<br>Ján Andreides<br>034 71 Ludrová 1 | konateľ | |
| Zástupcovia stavebníka | Ing. Oľga Martinisková<br>Miroslav Šiška | vedúca OSDaBF<br>technik SDaBF Martin | |
| Ostatní prizvaní účastníci | | | |

Rozdeľovník

1 x zhotoviteľ

4x stavebník

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
Nedostatky **neboli** (~~boli~~) zistené.

Dátum: 21.11.07 Podpis podľa podpisového vzoru:

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO
